


Приложение  
к постановлению администрации  
города Владимира  
от 15.08.2022 № 3993

369. Промышленный проезд от ул. Горького до д. 7 по Промышленному проезду  
(км 0+000 – км 1+730)



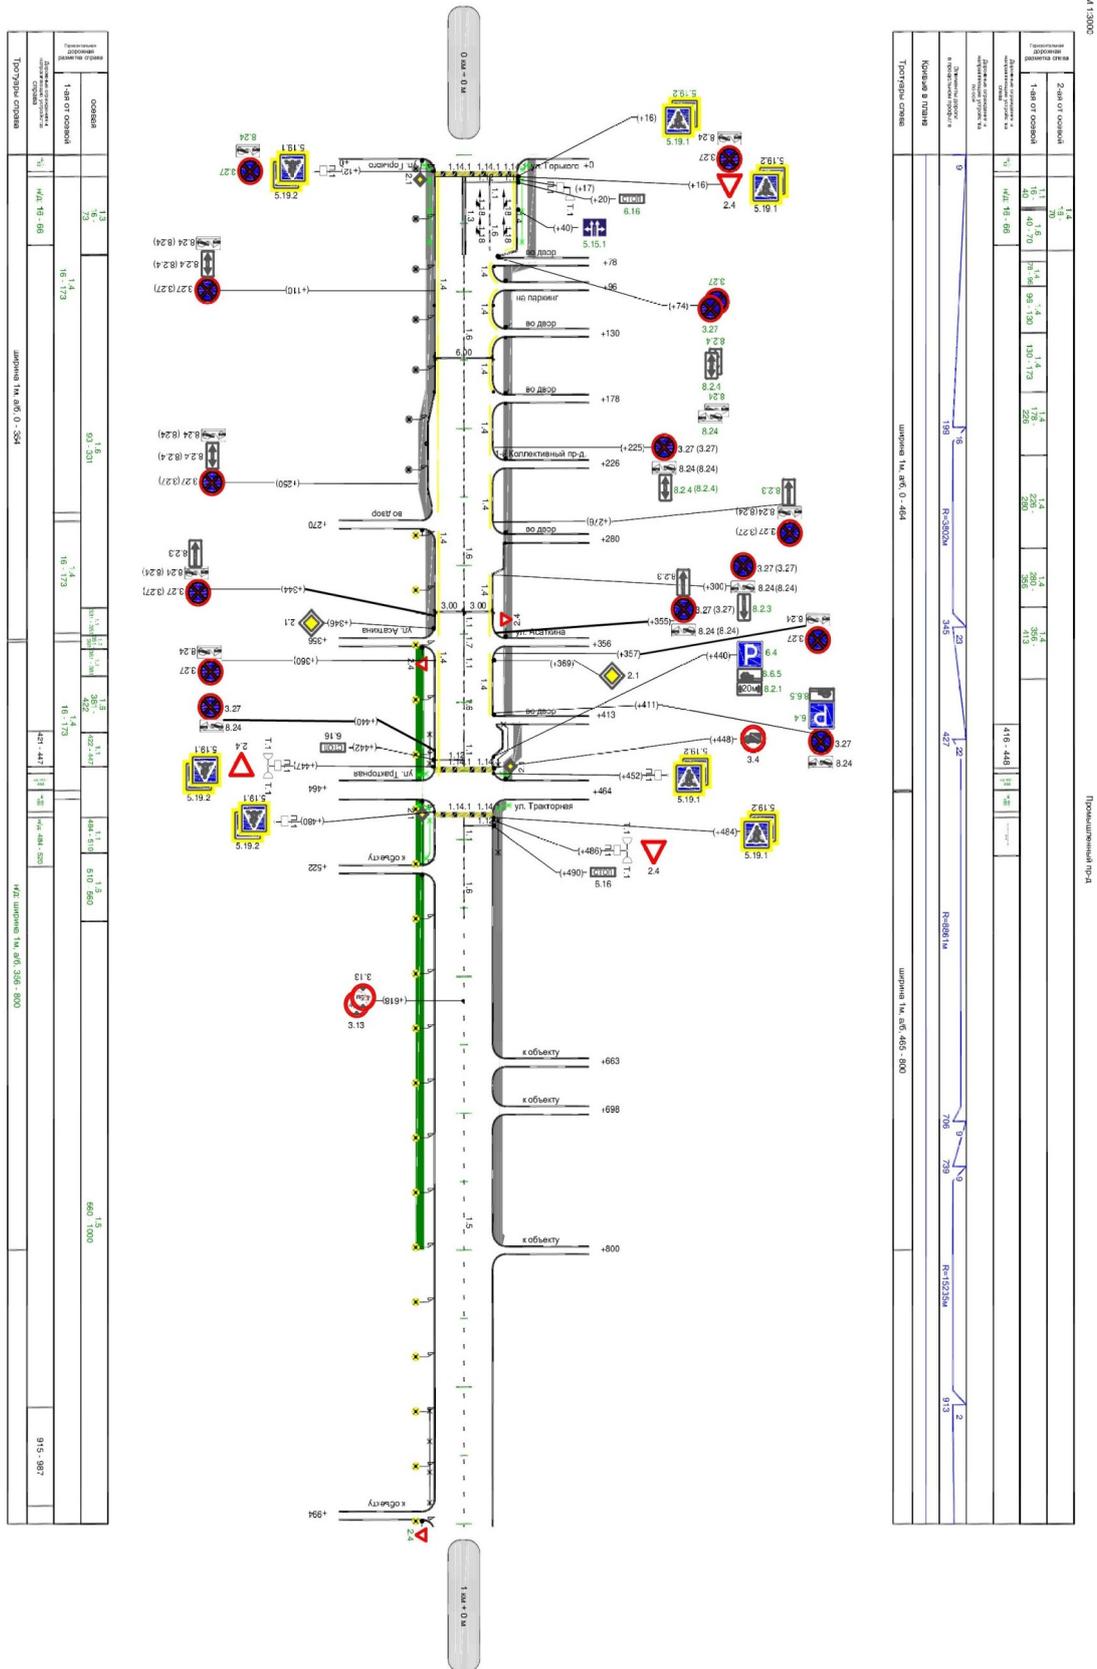

## Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.3(м)(бел)	1.4(м)(жел)	1.5(м)(бел)	1.6(м)(бел)	1.7(м)(бел)	1.12(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	1.18(шт)(бел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	2.000	1.000	0.250	0.750	0.500	4.000	16.000	16.000	2.710			
Ширина, м	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.40	4.00	4.00	1.00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0 - 1	175,000	57,000	306,000	440,000	309,000	20,000	12,000	21,000	21,000	4,000	113,315	64,200	177,515
1 - 2	0,000	0,000	0,000	140,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3,500	0,000	3,500
<b>ИТОГО</b>	<b>175,000</b>	<b>57,000</b>	<b>306,000</b>	<b>580,000</b>	<b>309,000</b>	<b>20,000</b>	<b>12,000</b>	<b>21,000</b>	<b>21,000</b>	<b>4,000</b>	<b>116,815</b>	<b>64,200</b>	<b>181,015</b>
ЛИНКМ	0,175	0,057	0,306	0,580	0,309	0,020	0,012	0,021	0,021	0,000			
ПРИВЕДКМ	0,175	0,114	0,306	0,145	0,232	0,010	0,048	0,336	0,336	0,000			
ПЛОЩАДЬ	17,500	11,400	30,600	14,500	23,175	1,000	4,800	33,600	33,600	10,840	116,815	64,200	181,015

## Ведомость наличия светофорных объектов

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ п/п	Адрес, км + м	Объект	Количество светофоров на объекте		Год установки	Расположение
			транспортных	пешеходных		
1	2	3	4	5	6	7
1	0+012		0	1	-	Справа
2	0+017		0	1	-	Слева
3	0+017		1	0	-	Слева
4	0+447		0	1	-	Справа
5	0+447		2	0	-	Справа
6	0+452		0	1	-	Слева
7	0+480		0	1	-	Справа
8	0+486		0	1	-	Слева
9	0+486		2	0	-	Слева
<b>Итого:</b>			<b>5</b>	<b>6</b>		

## Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		<b>Предупреждающие знаки</b>						
1	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+215	Демонтировать	1	справа
2	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+230	Требуется установить	1	слева
3	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+230	Требуется установить	1	справа
4	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+348	Требуется установить	1	слева
5	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+348	Требуется установить	1	справа
6	1.2	Железнодорожный переезд без шлагбаума			1+349	Демонтировать	1	слева
7	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+225	Демонтировать	1	справа
8	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+280	Требуется установить	1	справа
9	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+308	Требуется установить	1	слева
10	1.3.1	Однопутная железная дорога			1+321	Демонтировать	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>						
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>					4	
		<b>Итого требуется установить:</b>					6	
		<b>Итого:</b>					6	
		<b>Знаки приоритета</b>						
11	2.1	Главная дорога			0+211	Требуется установить	1	справа
12	2.1	Главная дорога			0+241	Требуется установить	1	слева
13	2.1	Главная дорога			0+346	Установлено	1	справа
14	2.1	Главная дорога			0+369	Установлено	1	слева
15	2.4	Уступите дорогу			0+016	Установлено	1	слева
23	2.4	Уступите дорогу			0+447	Установлено	1	справа
24	2.4	Уступите дорогу			0+486	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	2.4	Уступите дорогу	2		0+994	Требуется установить	1	справа на примыкании
30	2.4	Уступите дорогу	2		1+325	Требуется установить	1	справа на примыкании
31	2.4	Уступите дорогу	2		1+670	Требуется установить	1	справа на примыкании
32	2.4	Уступите дорогу	2		1+705	Требуется установить	1	справа на примыкании
33	2.5	Движение без остановки запрещено			1+280	Требуется установить	1	справа
34	2.5	Движение без остановки запрещено			1+308	Требуется установить	1	слева
		<b>Итого установлено:</b>					<b>11</b>	
		<b>Итого перенести:</b>						
		<b>Итого демонтировать:</b>						
		<b>Итого требуется установить:</b>					<b>13</b>	
		<b>Итого:</b>					<b>24</b>	
		<b>Запрещающие знаки</b>						
35	3.4	Движение грузовых автомобилей запрещено			0+448	Установлено	1	слева
36	3.13	Ограничение высоты			0+618	Установлено	2	по центру
37	3.27	Остановка запрещена			0+012	Установлено	1	справа
38	3.27	Остановка запрещена			0+030	Установлено	1	справа
39	3.27	Остановка запрещена			0+069	Установлено	1	слева
40	3.27	Остановка запрещена			0+074	Установлено	2	слева
41	3.27	Остановка запрещена			0+110	Установлено	2	слева
42	3.27	Остановка запрещена			0+250	Установлено	2	справа
43	3.27	Остановка запрещена			0+344	Установлено	2	справа
44	3.27	Остановка запрещена			0+360	Установлено	1	справа
45	3.27	Остановка запрещена			0+440	Установлено	1	справа
46	3.27	Остановка запрещена			0+225	Установлено	2	слева
47	3.27	Остановка запрещена			0+276	Установлено	2	слева
48	3.27	Остановка запрещена			0+300	Установлено	2	слева
49	3.27	Остановка запрещена			0+355	Установлено	2	слева
50	3.27	Остановка запрещена			0+357	Установлено	1	слева
51	3.27	Остановка запрещена			0+411	Установлено	1	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3.27	Остановка запрещена			0+016	Установлено	1	слева
		<b>Итого:</b>					<b>18</b>	
		<b>Знаки особых предписаний</b>						
52	5.15.1	Направление движения по полосам			0+040	Установлено	1	слева
53	5.19.1	Пешеходный переход			0+012	Установлено	1	справа
54	5.19.1	Пешеходный переход			0+016	Установлено	1	слева
55	5.19.1	Пешеходный переход			0+447	Установлено	1	справа
56	5.19.1	Пешеходный переход			0+452	Установлено	1	слева
57	5.19.1	Пешеходный переход			0+480	Установлено	1	справа
58	5.19.1	Пешеходный переход			0+484	Установлено	1	слева
59	5.19.2	Пешеходный переход			0+012	Установлено	1	справа
60	5.19.2	Пешеходный переход			0+016	Установлено	1	слева
61	5.19.2	Пешеходный переход			0+447	Установлено	1	справа
62	5.19.2	Пешеходный переход			0+452	Установлено	1	слева
63	5.19.2	Пешеходный переход			0+480	Установлено	1	справа
64	5.19.2	Пешеходный переход			0+484	Установлено	1	слева
		<b>Итого:</b>					<b>13</b>	
		<b>Информационные знаки</b>						
65	6.4	Парковка (парковочное место)			0+440	Установлено	1	слева
	6.4	Парковка (парковочное место)			0+411	Установлено		слева
66	6.16	<del>Стоп-линия</del>			0+020	Установлено	1	слева
67	6.16	<del>Стоп-линия</del>			0+442	Установлено	1	справа
68	6.16	<del>Стоп-линия</del>			0+490	Установлено	1	слева
69	6.16	<del>Стоп-линия</del>			1+280	Установлено	1	справа
70	6.16	<del>Стоп-линия</del>			1+308	Установлено	1	слева
		<b>Итого:</b>					<b>6</b>	
		<b>Знаки дополнительной информации(таблички)</b>						
76	8.2.4	Зона действия			0+110	Установлено	2	слева
77	8.2.4	Зона действия			0+250	Установлено	2	справа
78	8.2.4	Зона действия			0+344	Установлено	1	справа
	8.2.4	Зона действия			0+074	Установлено	2	слева

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 52290-2004	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м <sup>2</sup> (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8.2.4	Зона действия			0+225	Установлено	2	слева
	8.2.4	Зона действия			0+276	установлено	2	слева
	8.2.3	Зона действия			0+300	установлено	2	слева
	8.2.3	Зона действия			0+355	установлено	1	слева
79	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+440	установлено	1	слева
	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+411	установлено	1	слева
80	8.24	Работает эвакуатор			0+012	Требуется установить	1	справа
81	8.24	Работает эвакуатор			0+110	Демонтировать	1	справа
82	8.24	Работает эвакуатор			0+250	Демонтировать	1	слева
83	8.24	Работает эвакуатор			0+344	Требуется установить	2	слева
84	8.24	Работает эвакуатор			0+360	Установлено	1	справа
85	8.24	Работает эвакуатор			0+440	Демонтировать	1	слева
86	8.24	Работает эвакуатор			0+016	Установлено	1	слева
87	8.24	Работает эвакуатор			0+074	Установлено	2	слева
	8.24	Работает эвакуатор			0+225	Установлено	2	слева
	8.24	Работает эвакуатор			0+276	Установлено	2	слева
	8.24	Работает эвакуатор			0+300	Установлено	2	слева
	8.24	Работает эвакуатор			0+355	Установлено	2	слева
	8.24	Работает эвакуатор			0+357	Установлено	1	слева
		<b>Итого:</b>					<b>11</b>	
		<b>Всего:</b>					<b>81</b>	

### Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+230		7/7	0	220	Справа
2	0+278	1+718		37/37	1440	0	Справа
<b>Итого:</b>				44/44	1440	220	

### Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+354		Справа		354
2	0+000	0+464		Слева		464
3	0+356	0+800		Справа	444	
4	0+465	0+800		Слева		335
<b>Итого:</b>					444	1153

## Ведомость размещения пешеходных ограждений

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Протяженность, м		Дата установки, г	Расположение	Тип	Уровень удерживающей способности	Высота, м	Зона расположения
			Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	0+000	0+012	12			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
2	0+000	0+012	12			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
3	0+016	0+066	50			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
4	0+016	0+066	50			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
5	0+416	0+448		32		Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
6	0+421	0+447		26		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
7	0+452	0+464	12			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
8	0+452	0+464	12			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
9	0+464	0+480	16			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
10	0+464	0+480	16			Слева	Направляющие	У - 1	1,20	
11	0+484	0+512		28		Слева	Направляющие			
12	0+484	0+520	36			Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
13	0+915	0+987		72		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
14	1+005	1+160		155		Справа	Направляющие	У - 1	1,20	
<b>Итого:</b>			<b>216</b>	<b>313</b>						

## Ведомость размещения сигнальных столбиков

Дорога: Промышленный пр-д  
Участок: 0,000 - 1,730 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м/шт	Фактически установленные, м/шт	Демонтировать, м/шт	Расположение	Материал	Зона расположения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1+272	1+286	14/10			Справа	Пластмасса	
2	1+280	1+295	15/10			Слева	Пластмасса	
3	1+291	1+305	14/10			Справа	Пластмасса	
4	1+300	1+314	14/10			Слева	Пластмасса	
<b>Итого:</b>			<b>57/40</b>					
