


Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 11.04.2024 № 792

105. пр-д Быковский от пр.Ленина до ул.Красная Горка
(км 0+000 – км 0+755)

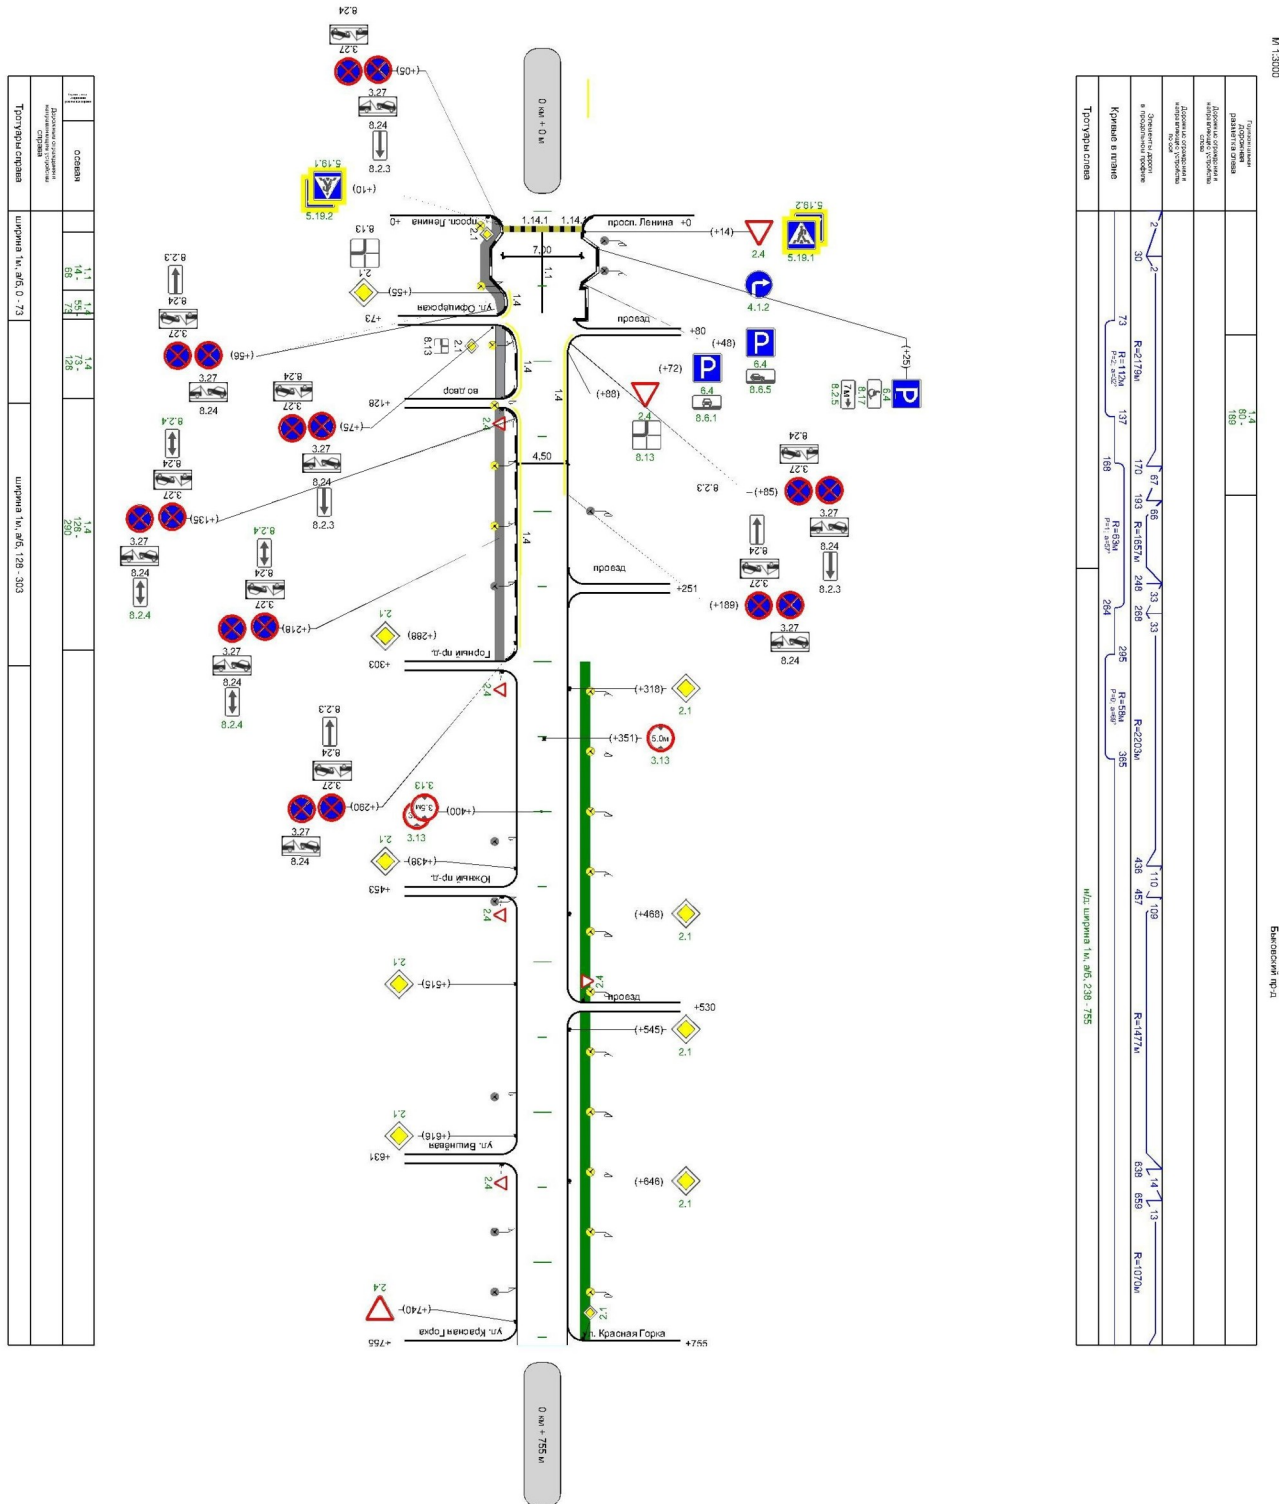

Ведомость дорожной разметки (горизонтальной)

Дорога: Быковский пр-д
Участок: 0,000 - 0,755 км.

№ км	1.1(м)(бел)	1.14.1(м)(бел)	1.14.1(м)(жел)	ИТОГО, м2(бел)	ИТОГО, м2(жел)	ВСЕГО, м2
коэф.привед. к 1.1	1.000	16.000	16.000			
Ширина, м	0.10	4.00	4.00			
1	2	3	4	5	6	7
0 - 1	54,000	7,000	7,000	16,600	11,200	27,800
ИТОГО	54,000	7,000	7,000	16,600	11,200	27,800
ЛИН.КМ	0,054	0,007	0,007			
ПРИВЕД.КМ	0,054	0,112	0,112			
ПЛОЩАДЬ	5,400	11,200	11,200	16,600	11,200	27,800

Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: Быковский пр-д
Участок: 0,000 - 0,755 км.

№ п/п	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Количество опор / светильников	Протяженность, м		Расположение
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0+010	0+210		6/6	200	0	Справа
2	0+020	0+040		2/2	0	20	Слева
3	0+200	0+200		1/1	0	0	Слева
4	0+240	0+720		13/13	480	0	Слева
5	0+250	0+420		2/2	0	170	Справа
6	0+460	0+590		2/2	0	130	Справа
7	0+680	0+720		2/2	0	40	Справа
Итого:				28/28	680	360	

Ведомость размещения дорожных знаков

Дорога: Быковский пр-д
Участок: 0,000 - 0,755 км.

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Знаки приоритета						
1	2.1	Главная дорога			0+055	Установлено	1	справа
2	2.1	Главная дорога			0+288	Установлено	1	справа
3	2.1	Главная дорога			0+318	Установлено	1	слева
4	2.1	Главная дорога			0+438	Установлено	1	справа
5	2.1	Главная дорога			0+468	Установлено	1	слева
6	2.1	Главная дорога			0+515	Установлено	1	справа
7	2.1	Главная дорога			0+545	Установлено	1	слева
8	2.1	Главная дорога			0+616	Установлено	1	справа
9	2.1	Главная дорога			0+646	Установлено	1	слева
11	2.4	Уступите дорогу			0+014	Установлено	1	слева
12	2.4	Уступите дорогу			0+088	Установлено	1	слева
14	2.4	Уступите дорогу	2		0+128	Установлено	1	справа на прилькании
15	2.4	Уступите дорогу	2		0+530	Установлено	1	слева на прилькании
16	2.4	Уступите дорогу			0+740	Установлено	1	справа
		Итого:					16	
		Запрещающие знаки						
17	3.13	Ограничение высоты			0+351	Требуется установить	1	по центру
18	3.13	Ограничение высоты			0+400	Требуется установить	2	по центру
		Итого:					3	
		Предписывающие знаки						
19	4.1.2	Движение направо			0+014	Требуется установить	1	слева
		Итого:					1	
		Знаки особых предписаний						
21	5.19.1	Пешеходный переход			0+010	Требуется установить	1	справа
23	5.19.1	Пешеходный переход			0+014	Требуется установить	1	слева
25	5.19.2	Пешеходный переход			0+010	Требуется установить	1	справа

№ п/п	Номер знака по ГОСТ 32945-2014	Наименование знака	Типоразмер знака	Площадь знаков, м ² (для знаков индивидуального проектирования)	Адрес, км + м	Установлено / требуется установить или демонтировать	Количество	Месторасположение
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	5.19.2	Пешеходный переход			0+014	Требуется установить	1	слева
		Итого:					4	
		Информационные знаки						
33	6.4	Парковка (парковочное место)			0+025	Требуется установить	1	слева
34	6.4	Парковка (парковочное место)			0+048	Требуется установить	1	слева
35	6.4	Парковка (парковочное место)			0+072	Требуется установить	1	слева
		Итого:					3	
		Знаки дополнительной информации (таблички)						
38	8.2.5	Зона действия			0+025	Требуется установить	1	слева
40	8.6.1	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+072	Требуется установить	1	слева
42	8.6.5	Способ постановки транспортного средства на стоянку			0+048	Требуется установить	1	слева
43	8.13	Направление главной дороги			0+055	Установлено	1	справа
44	8.13	Направление главной дороги			0+088	Требуется установить	1	слева
47	8.17	Инвалиды			0+025	Требуется установить	1	слева
		Итого:					6	
		Всего:					33	

Ведомость размещения пешеходных дорожек (тротуаров)

Дорога: Быковский пр-д
Участок: 0,000 - 0,755 км.

№	Начало участка, км+м	Конец участка, км+м	Объект установки	Расположение	Протяженность, м	
					Проектируемые в соответствии с нормативными документами, м	Фактически установленные, м
1	2	3	4	5	6	7
1	0+000	0+073		Справа		73
2	0+128	0+303		Справа		175
3	0+238	0+755		Слева	517	
Итого:					517	248
